


# FASERING WERKEN

Status eind november 2025

- FASE 1 – 4b: 'afgewerkt'
- FASE 4c: 'in uitvoering' (tot jan '26)  
(M. de Taeyelaan tot V. De Jaegerelaan)
- FASE 5a : 'in uitvoering' (tot feb '26)  
(Serिंगlaan + M. de Taeyelaan t/m Wilgenlaan)
- FASE 5b : 'gepland' (feb '26 – mrt '26)  
(M. de Taeyelaan: Cederlaan – politiekantoor)
- FASE 5c: 'gepland' (mrt '26 – mei '26)  
(M. de Taeyelaan: politiekantoor – N8)
- FASE 6 : 'in uitvoering' (nov '25 – april '26)  
(Populierenlaan)

\* Timing onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden  
(weerverlet...)

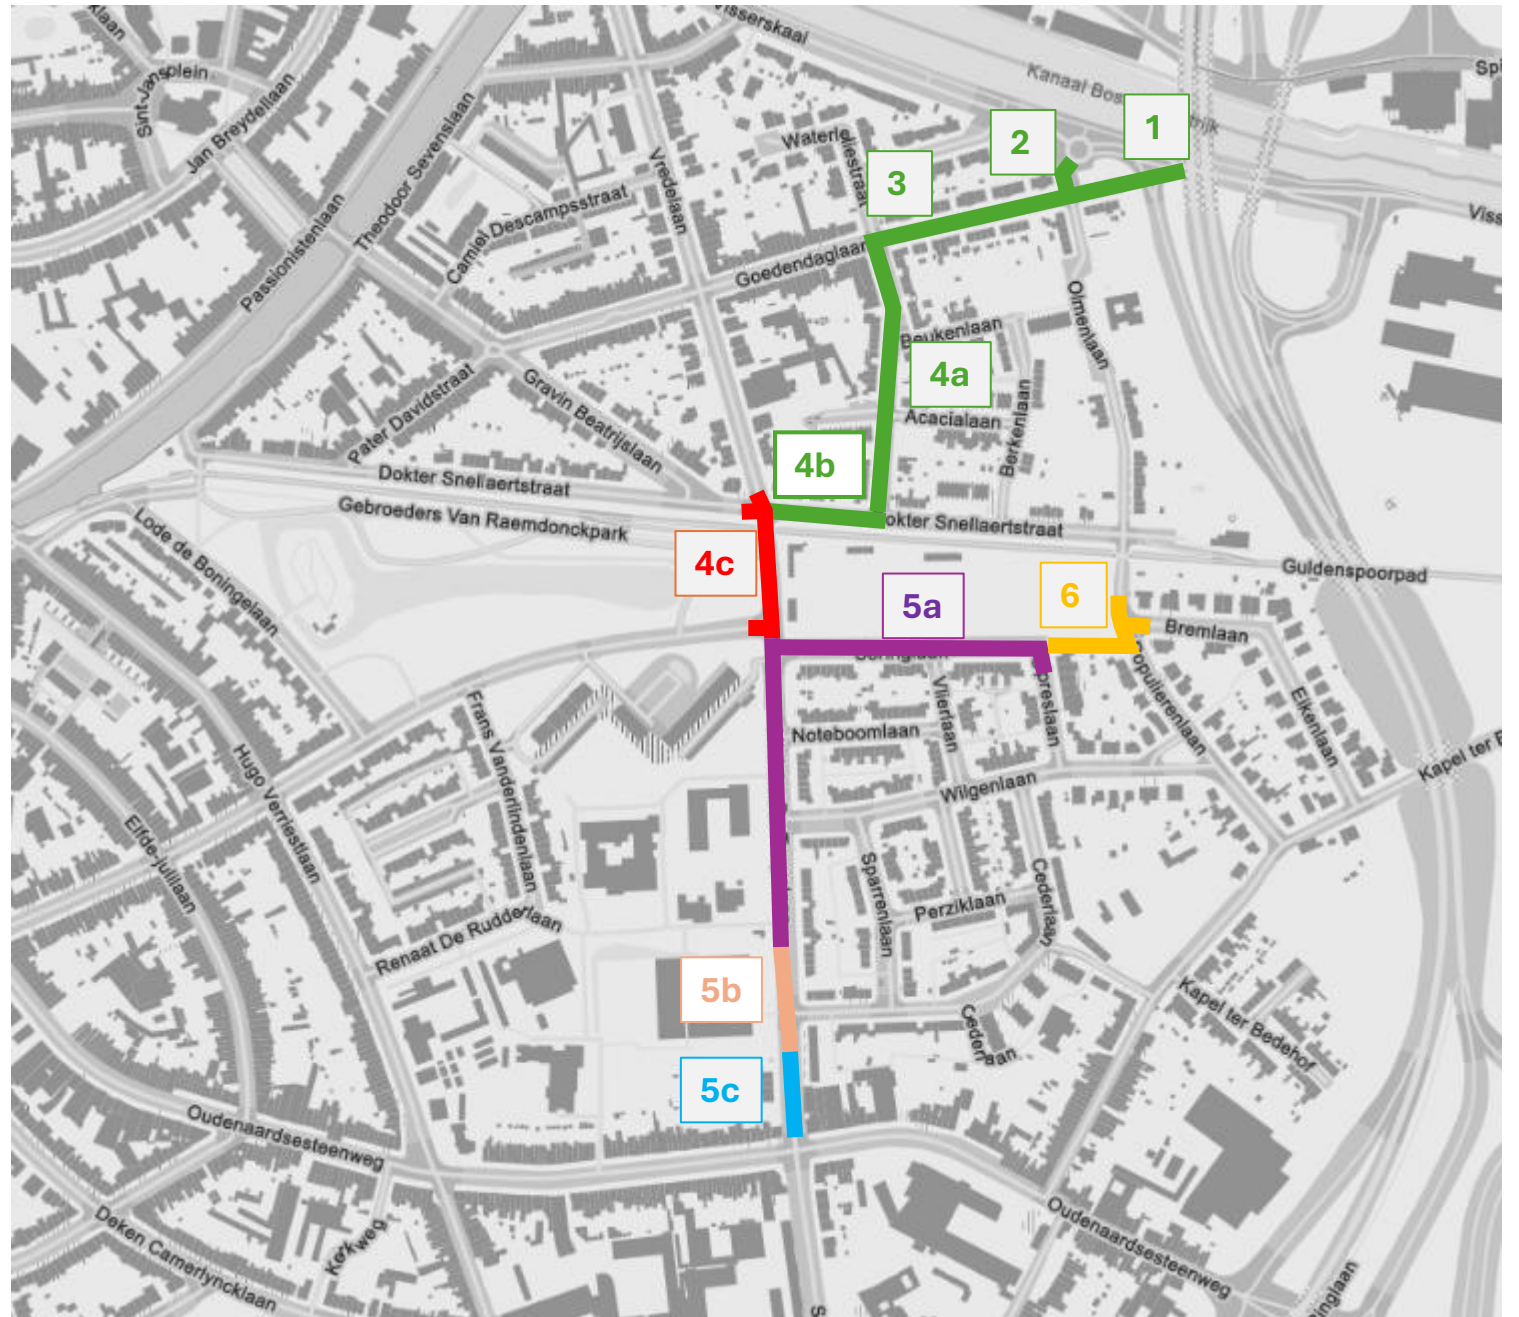

# OMLEIDING WERKEN

Vanaf eind nov '25 tot +- februari '26

WERFZONE

OMLEIDING

'Wijk' bereikbaar via Cederlaan

